Requalification de l'ex-RN 2112 en **BOULEVARD URBAIN**

Phase 2 novembre*2010 > juin 2011*

2e réunion riverains sur l'aménagement de l'avenue des Vignerons/square du Muscat

Mardi 19 octobre 2010 à 18h
salle Voltaire

Frontignan la Peyrade
la ville envie

HIER LA ROUTE
DEMAIN
LA VIE

Aujourd’hui

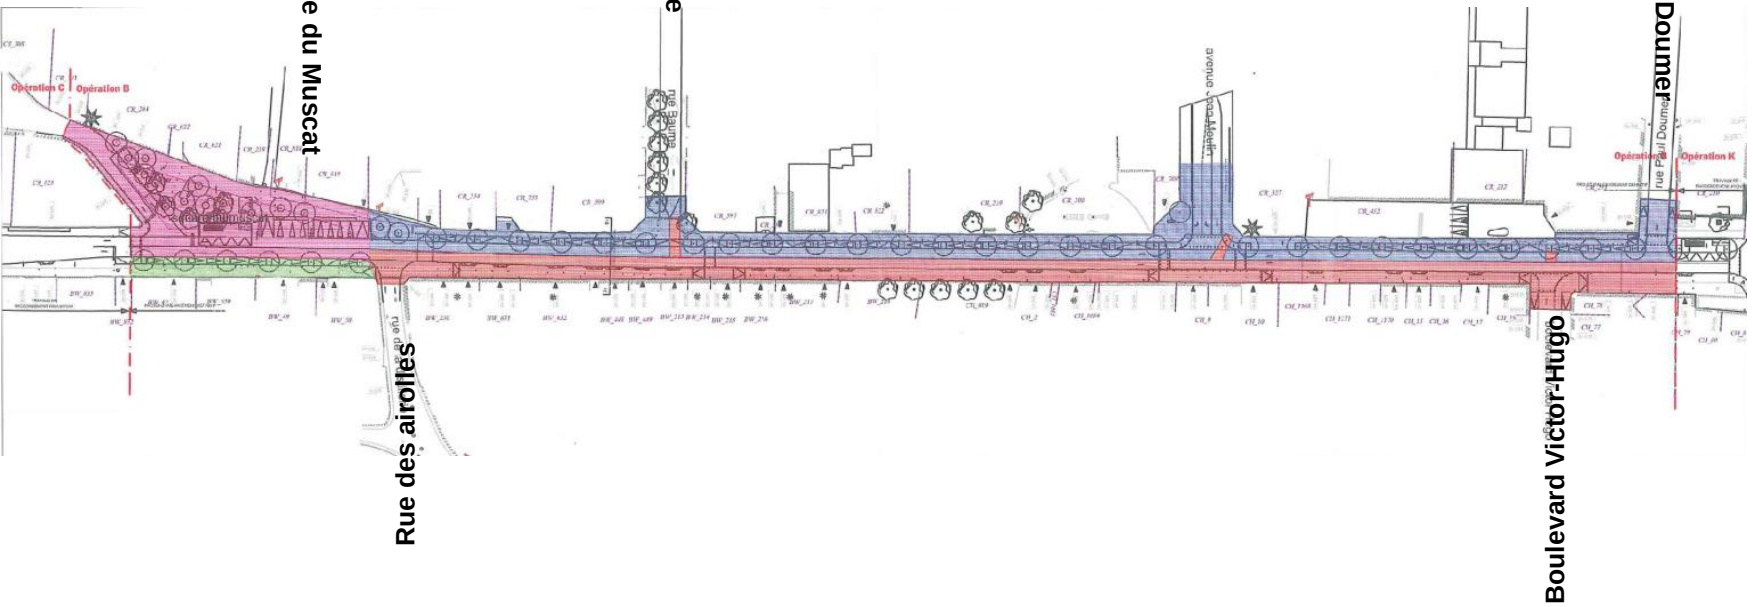

Frontignan la Peyrade
laville envie

HIER LA ROUTE DEMAIN LA VIE

Aujourd'hui

Avenue des Vignerons

Square du Muscat

Frontignan la Peyrade
laville envie

HIER LA ROUTE
DEMAIN
LA VIE

Demain

Gardiole Mer

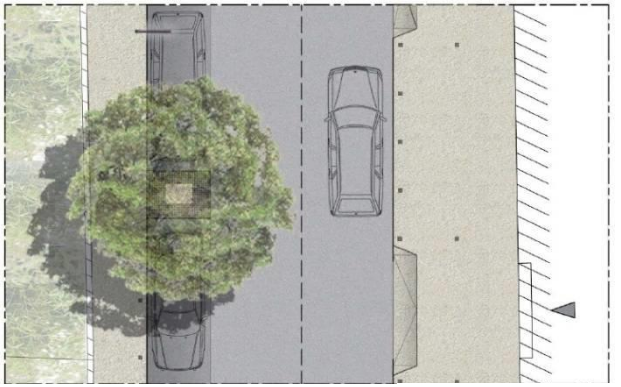

Gardiole Mer

Avenue des Vignerons

Demain

Plan large de l'avenue des Vignerons : vue en coupe

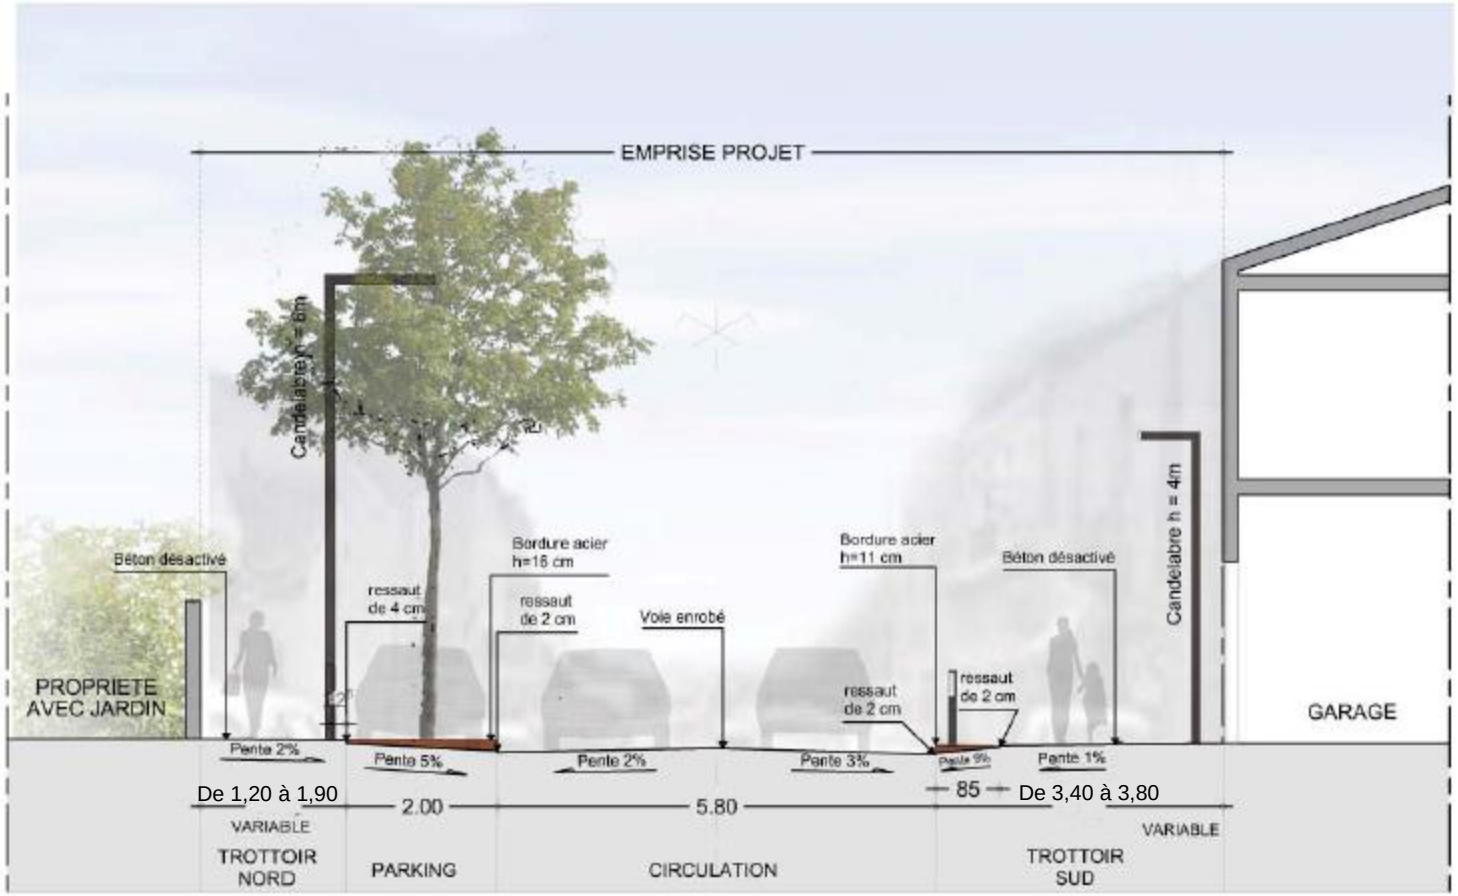

Gardiole **Mer**

Demain

Avenue des Vignerons : sous la voie

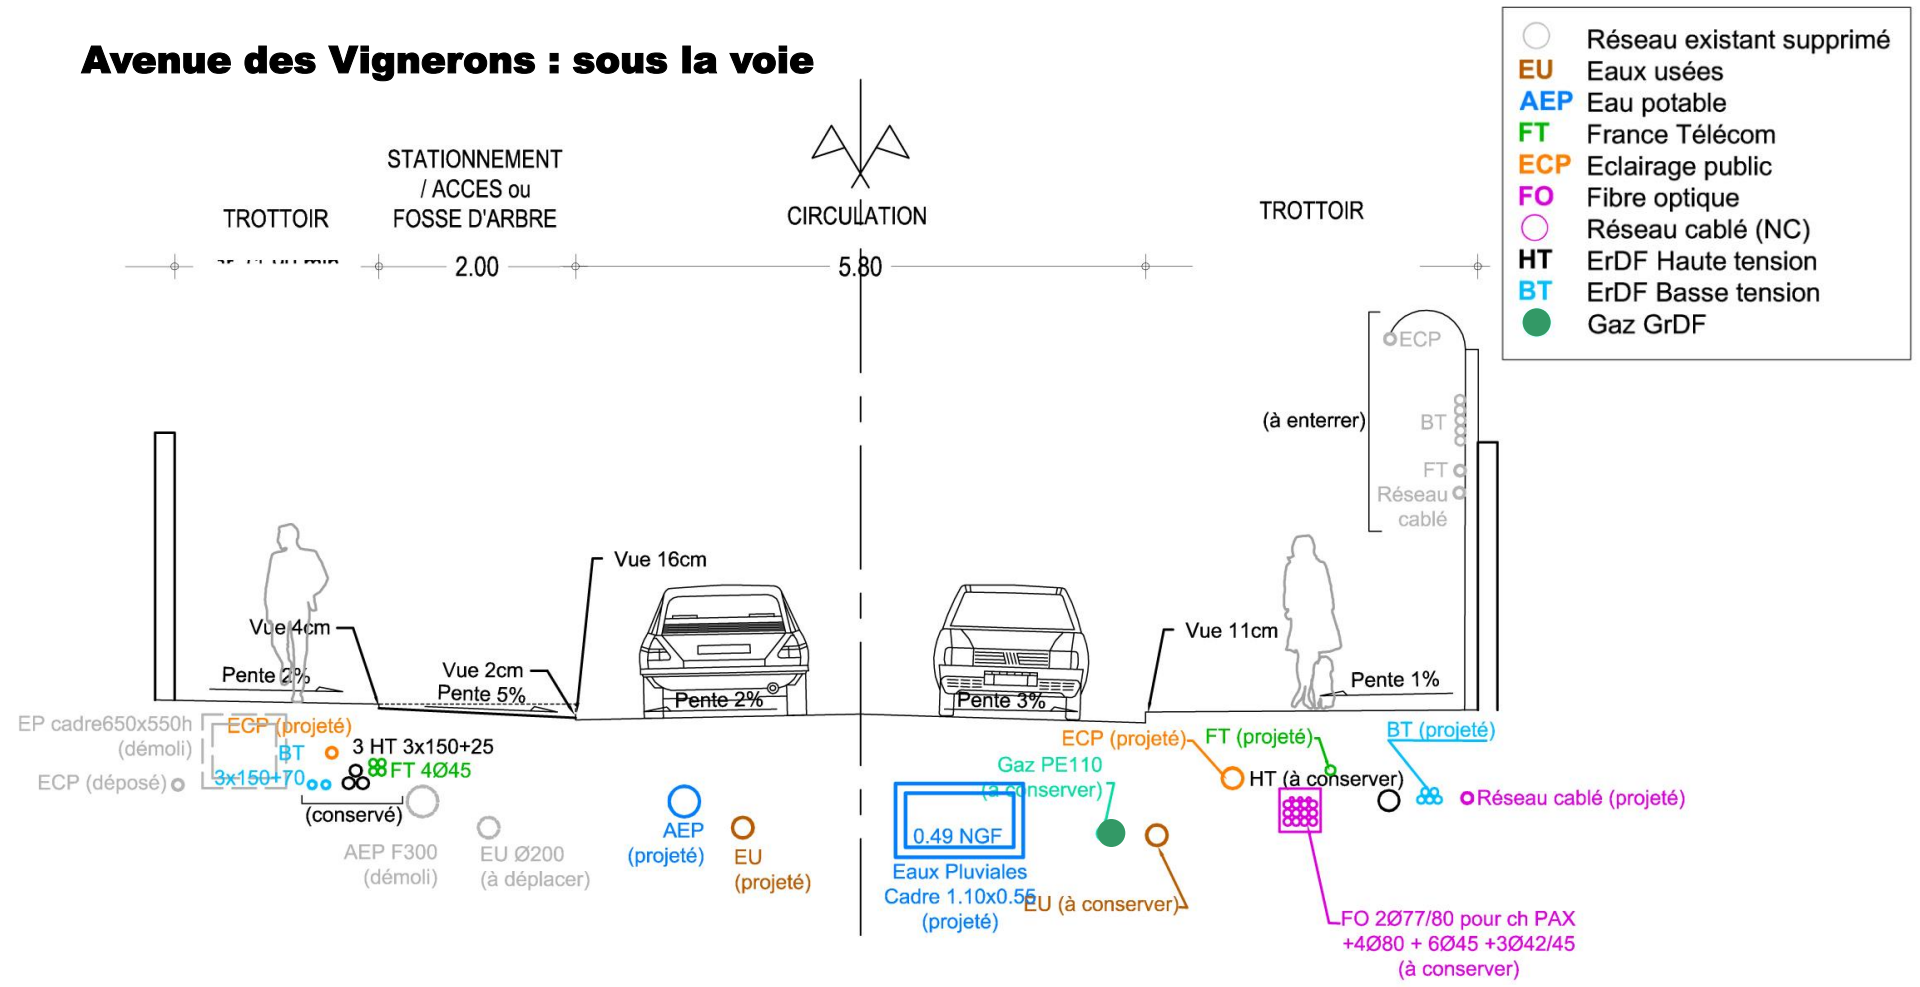

Gardiole **Mer**

Demain

Square du Muscat

Carrefour Jean-Moulin

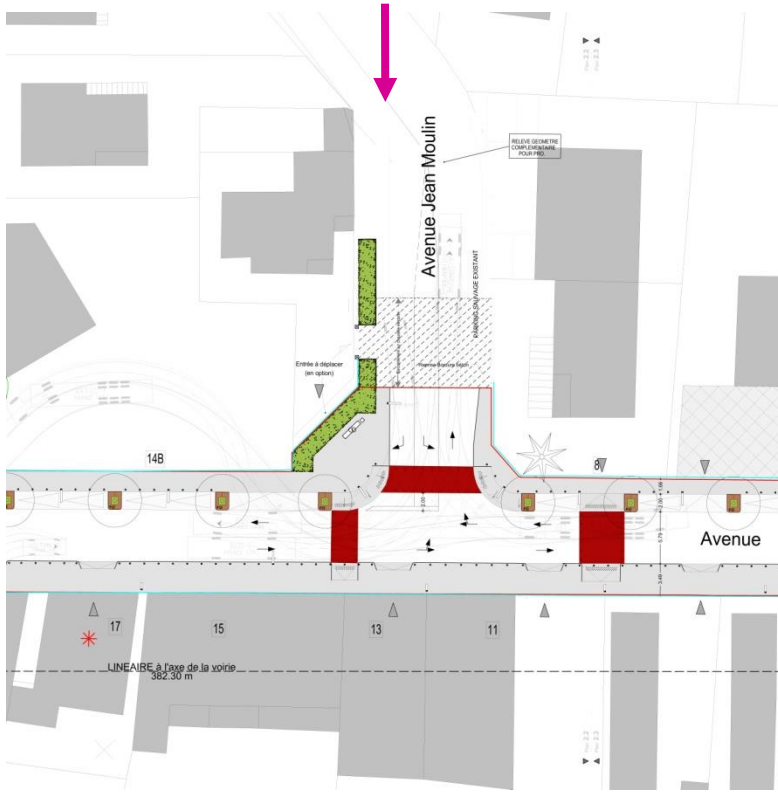

Frontignan la Peyrade
laville envie

HIER LA ROUTE
DEMAIN
LA VIE

L’avenue des Vignerons en chiffres

450 mètres linéaires

Montant prévisionnel des travaux : 3,2 M d’€ TTC

Un chantier sous la voie :

- Reprise de branchements eaux usées et potable
- Mise à niveau des réseaux
- Reprise complète de la chaussée
- Création de 700 mètres linéaires de réseau pluvial
- Enfouissement de 1,2 km de réseaux aériens (électricité, téléphonie, Internet)

Un chantier sur la voie :

- Création de 4500m2 de trottoirs en béton désactivé
- Nouveau mobilier urbain
- Création de 44 places de stationnement
- Plantations de 41 arbres et d’espaces verts
- Nouveau réseau d’éclairage public avec 75 candélabres
- Création de passages piétons
- Mise en place d’une signalétique urbaine

S’y ajoutent les études et travaux de mises aux normes, de dévoiements et d’enfouissement de réseaux réalisés avec et par les concessionnaires (Thau agglo, SAEP, Veolia, EDF, GDF, France Télécom, Numéricâble, …)

Frontignan la Peyrade
laville envie

HIER LA ROUTE
DEMAIN
LA VIE

Travaux préparatoires aux déviations

Carrefours Gendarmerie et Carignan
Mise en sécurité des carrefours
Travaux du 28 octobre
au 1er novembre

Carrefour Mistral/De Gaulle
Mise en place d'un mini-giratoire provisoire
Travaux du 11 au 15 octobre

Zone de travaux
Avenue des vignerons

Contournement sud

Contournement nord

Avenue Schweitzer/route de Montpellier
Aménagement d'un giratoire en dur
Travaux du 25 octobre au 12 novembre

Rue du Négoce et quai Voltaire prolongé
Mise en sens unique à partir du 18 octobre
Travaux du 18 au 25 octobre

Rue Frédéric-Mistral
Suppression temporaire
de 20 places de stationnement
pendant la durée du chantier
Travaux du 25 au 27 octobre

Dates de démarrage sous réserve de conditions météorologiques

Frontignan la Peyrade
laville envie

HIER LA ROUTE DEMAIN LA VIE

Principes d'organisation du chantier

Principe n° 1 :

Les travaux du réseau de pluvial imposent le rythme d'évolution du chantier

Principe n° 2 :

Conserver une voie praticable de circulation pour les riverains et les commerces dans le sens centre-ville – La Peyrade

Principe n° 3 :

Des travaux réalisés par moitié de chaussée autant que possible avec des fermetures uniquement pour raisons techniques et de sécurité

Points difficiles du chantier

Certains travaux difficiles de raccordement des réseaux de pluvial et de voirie entraîneront la fermeture de certaines voies

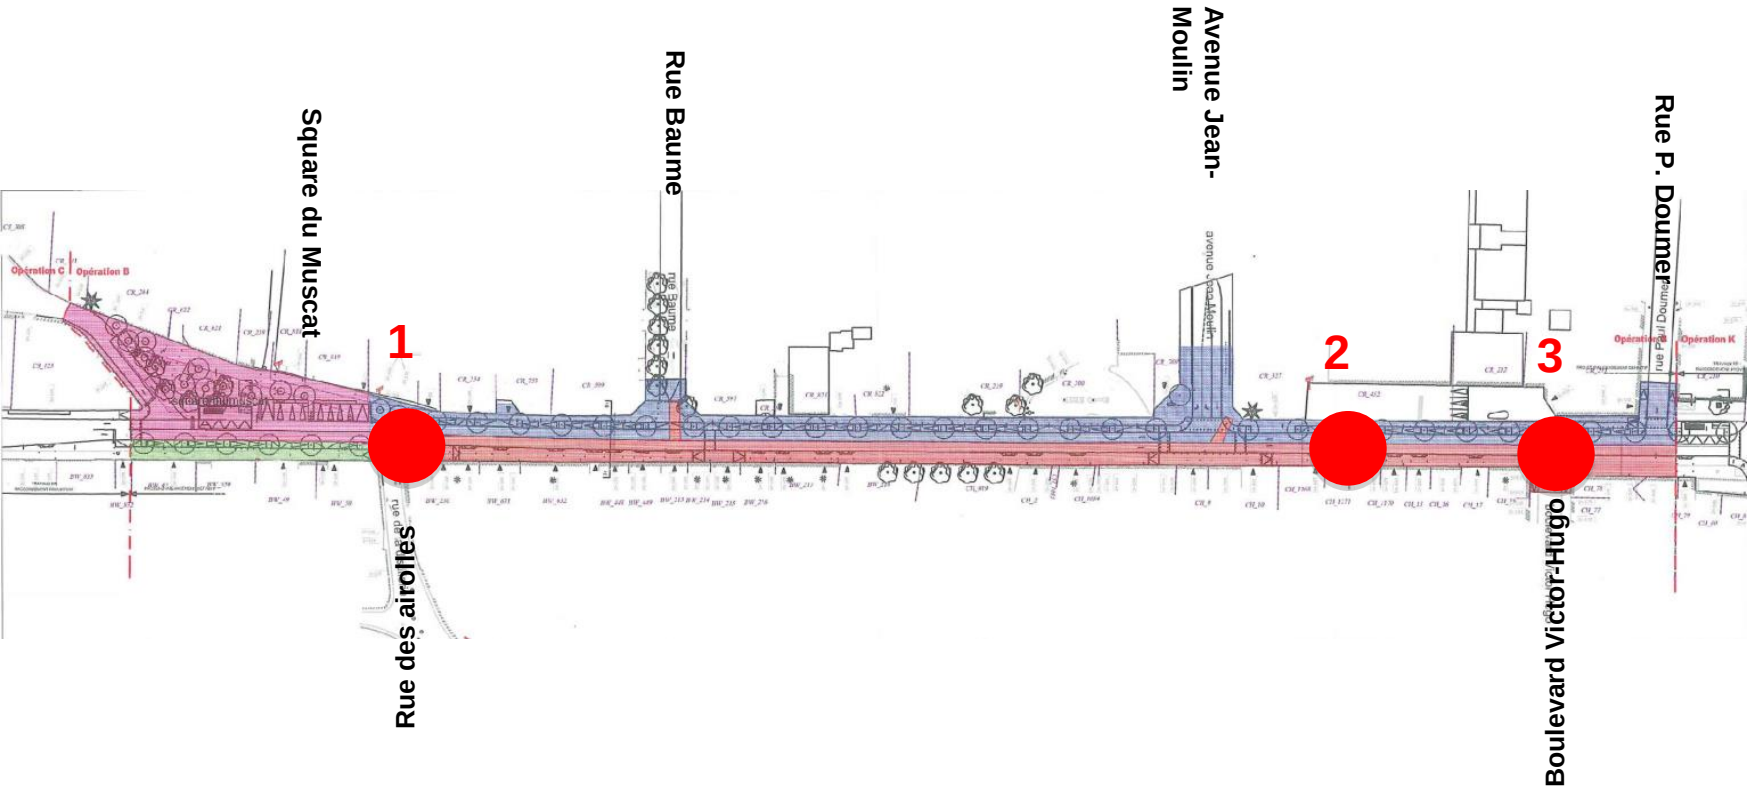

Frontignan la Peyrade
laville envie

HIER LA ROUTE
DEMAIN
LA VIE

Points difficiles du chantier
1 - rue des Airolles

Les travaux de raccordement des réseaux de pluvial et de voirie à ce carrefour nécessiteront la fermeture de la voie pour 6 semaines

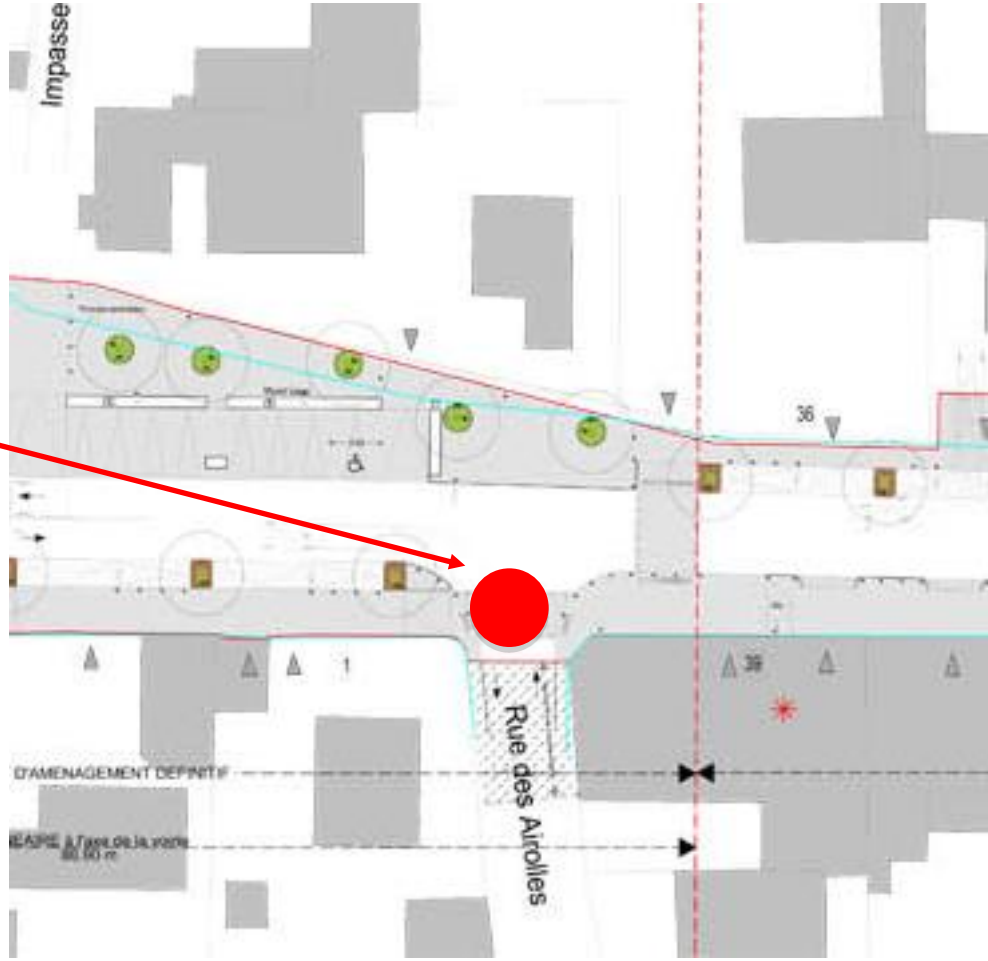

Frontignan la Peyrade
laville envie

HIER LA ROUTE
DEMAIN
LA VIE

Points difficiles du chantier
2 – av. Jean-Moulin av. F.Mistral

Les travaux de raccordement des réseaux de pluvial et de voirie nécessiteront la fermeture complète de ce tronçon pour 6 semaines

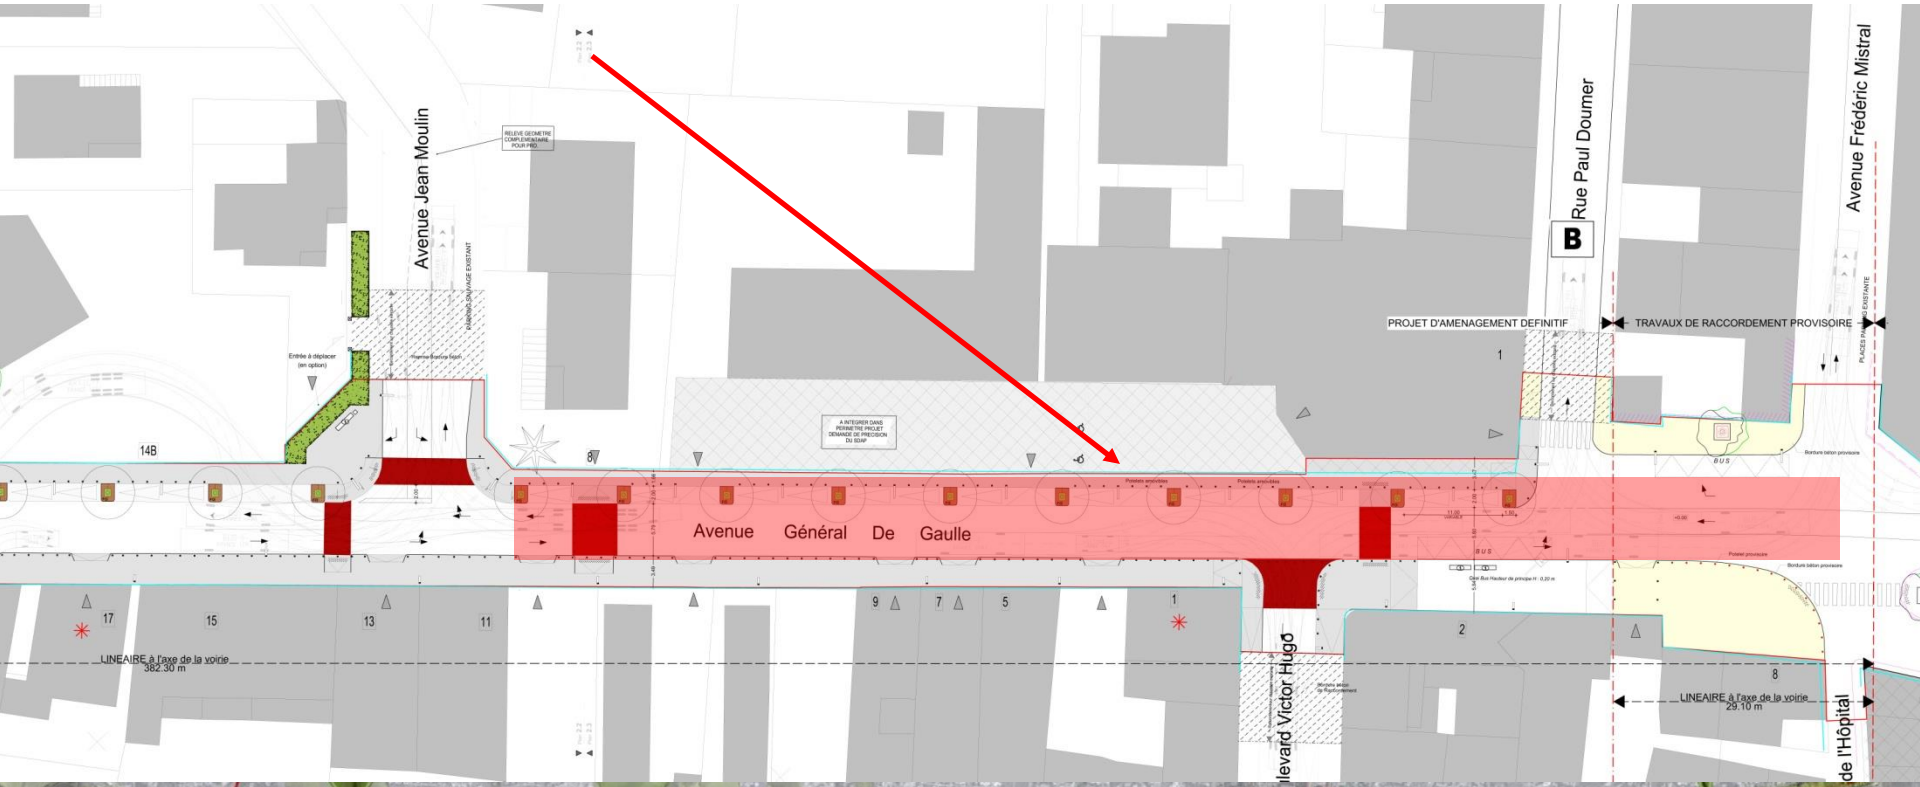

Frontignan la Peyrade
laville envie

HIER LA ROUTE
DEMAIN
LA VIE

Points difficiles du chantier
3 - bd Victor-Hugo

Les travaux de raccordement des réseaux de pluvial et de voirie à ce carrefour nécessiteront la fermeture complète de la voie pour 8 semaines

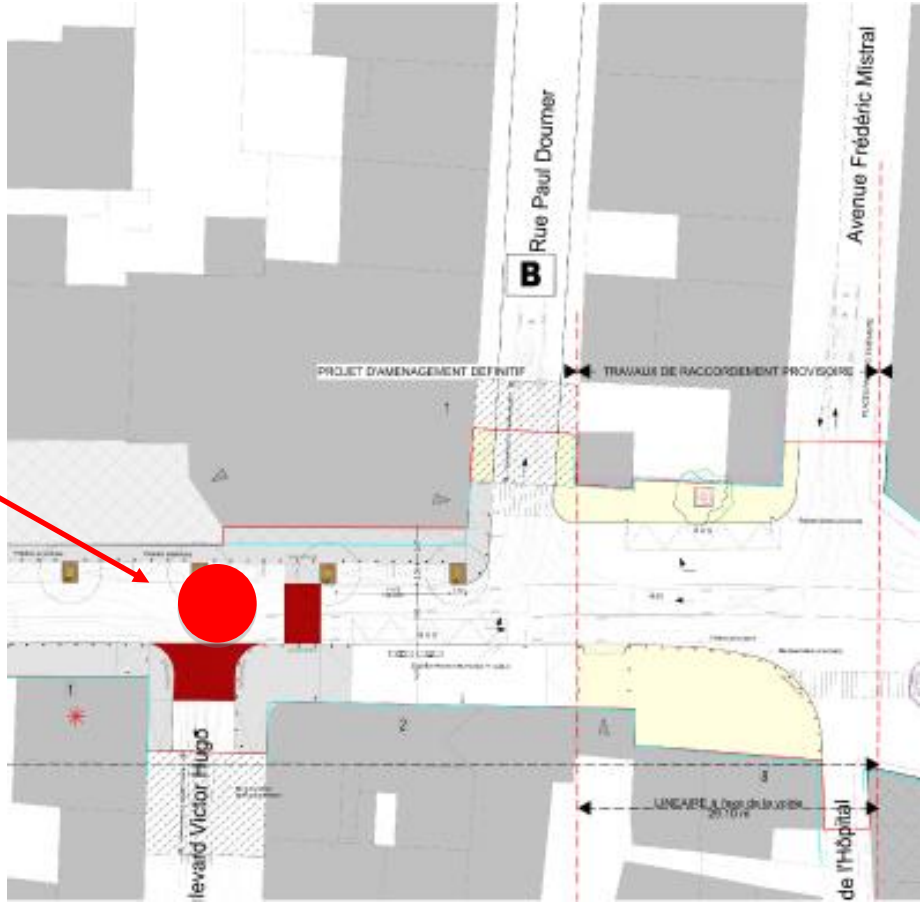

Frontignan la Peyrade
laville envie

HIER LA ROUTE
DEMAIN
LA VIE

Calendrier prévisionnel

1- Phase administrative et de concertation : mai 2010 à octobre 2010

- Réunion publique du 27 mai 2010
- Définition du programme
- Appel d'offre et notification des entreprises
- Planification détaillée des travaux

2- Travaux préparatoires : octobre-novembre 2010

- Déviation et modernisation de certains réseaux concessionnaires
- Mise en place des itinéraires de déviation
- Transfert des arrêts de bus

3- Phases de travaux de voirie et réseaux : novembre 2010 à avril 2011

- Démolition de la voirie
- Approfondissement des réseaux concessionnaires pour réaliser le pluvial
- Réalisation du réseau de pluvial
- Enfouissement des réseaux aériens et pose des réseaux d'éclairage

4- Travaux sur la voie de janvier 2011 à avril 2011

- Pose des bordures et mise à niveau des trottoirs
- Réalisation des revêtements sur les trottoirs et chaussée
- Mise en place des mâts d'éclairage

Des travaux réalisés par moitié de chaussée autant que possible avec des fermetures pour des raisons de sécurité

5- Travaux de finition : juin 2011

- Pose de la signalisation et du mobilier urbain

Réouverture à la circulation fin juin 2011

Frontignan la Peyrade
laville envie

HIER LA ROUTE
DEMAIN
LA VIE

Circuler dans la zone de travaux

Un chantier difficile car :

- **La voie a une emprise réduite**
- **Les travaux de réseaux sont particulièrement importants**
- **Peu de stationnements alternatifs**

La circulation sera très contraignante pendant toute la durée des travaux :

- **Des coupures ponctuelles de la circulation seront rendues obligatoires pour des raisons de sécurité**
- **Quand la circulation sera ouverte elle concernera uniquement le sens : centre-ville → la Peyrade**

La circulation piétonne sera organisée :

- **Une signalisation spécifique sera mise en place**
- **Les accès piétons riverains et commerces seront maintenus mais contraints**

Il sera donc nécessaire d'emprunter les itinéraires de déviation mis en place

Frontignan la Peyrade
laville envie

HIER LA ROUTE
DEMAIN
LA VIE

Itinéraires de déviation

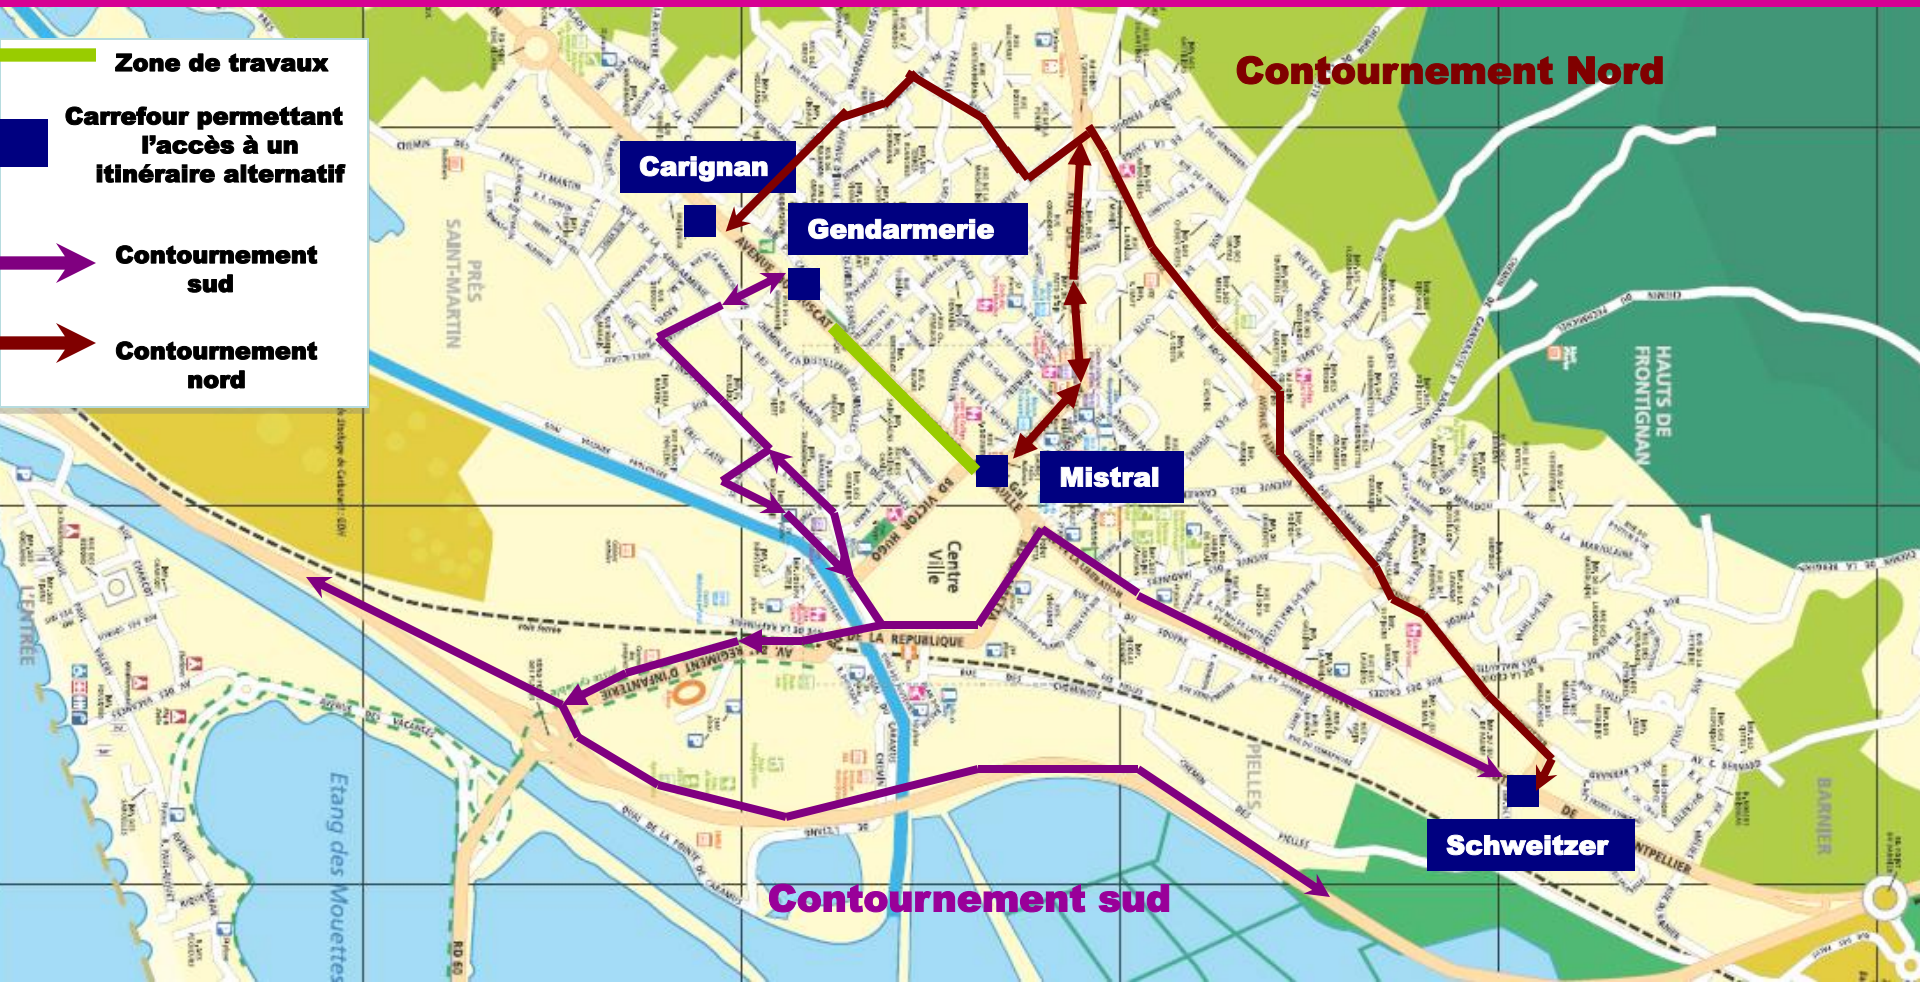

Frontignan la Peyrade
laville envie

HIER LA ROUTE DEMAIN LA VIE

Itinéraires de circulation des bus

Frontignan la Peyrade
laville envie

HIER LA ROUTE
DEMAIN LA VIE

Stationner pendant le chantier

Nos conseils avant et pendant le chantier

Avant le chantier :

- Contactez les concessionnaires pour tous travaux prévus sur votre logement (EDF, GDF, Thau agglo, ...)
- Signalez tout projet de modification d'entrée de logement
- Faites-nous part de vos contraintes

- Soyez informés en temps réel en nous indiquant vos numéros de portables et adresses courriel

Pendant le chantier : informez immédiatement la Ville de tout problème avec les entreprises intervenantes. C'est indispensable pour engager une procédure en cas de dégradation.

Pour toutes vos questions avant et pendant le chantier,
la Ville est votre interlocuteur
Elle met à votre disposition un numéro de téléphone unique
Votre conseiller chantier : 04 67 18 51 50

Un numéro d'astreinte chantier disponible à toute heure vous sera communiqué avant l'ouverture du chantier

Vos questions
